



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação



STI

**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO**

Reunião do COMITÊ GESTOR DE TI

29 de Agosto de 2014




Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

Pauta



- 
- 1.Acompanhamento das Ações da Reunião Anterior**
 - 2.Acompanhamento do Controle Orçamentário**
 - 3.Acompanhamento da Carteira de Projetos**
 - 4.Demandas do Desenvolvimento - Corregedoria**
 - 5.Estudo WiFi Corporativo TJES**
 - 6.Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES**



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

A background graphic featuring a central globe surrounded by various floating rectangular blocks and lines, suggesting a digital or data environment.

Acompanhamento das Ações da Reunião Anterior

Gerenciamento de Ações



| Descrição | Responsável | Data Limite | Status |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Registrar boletim de ocorrência relativo à invasão do Site da Corregedoria. | Jean Oliveira | 15 dias | ● Concluída |



POLÍCIA CIVIL
CRIMES ELETRÔNICOS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES ELETRÔNICOS

Avenida Nossa Senhora da Penha, nº2.290, Santa Luiza – Vitória / ES – CEP:29045-402

Tel.: Recepção - (27) 3137-2607, Gabinete - (27) 3137-9106, Investigação – (27) 3324-4462

WWW.PC.ES.GOV.BR / e-mail: DRCE@PC.ES.GOV.BR

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 1054/2014

DATA DA CONFECÇÃO: 20/08/2014

TIPIFICAÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA

LOCAL: INTERNET

DATA: 26/05/2014



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação


A 3D wireframe globe with several floating rectangular data blocks or server racks around it, set against a dark background with a grid pattern.

Acompanhamento Controle Orçamentário

Controle Orçamentário da STI




Secretaria - Movimentação Orçamentária Registrada

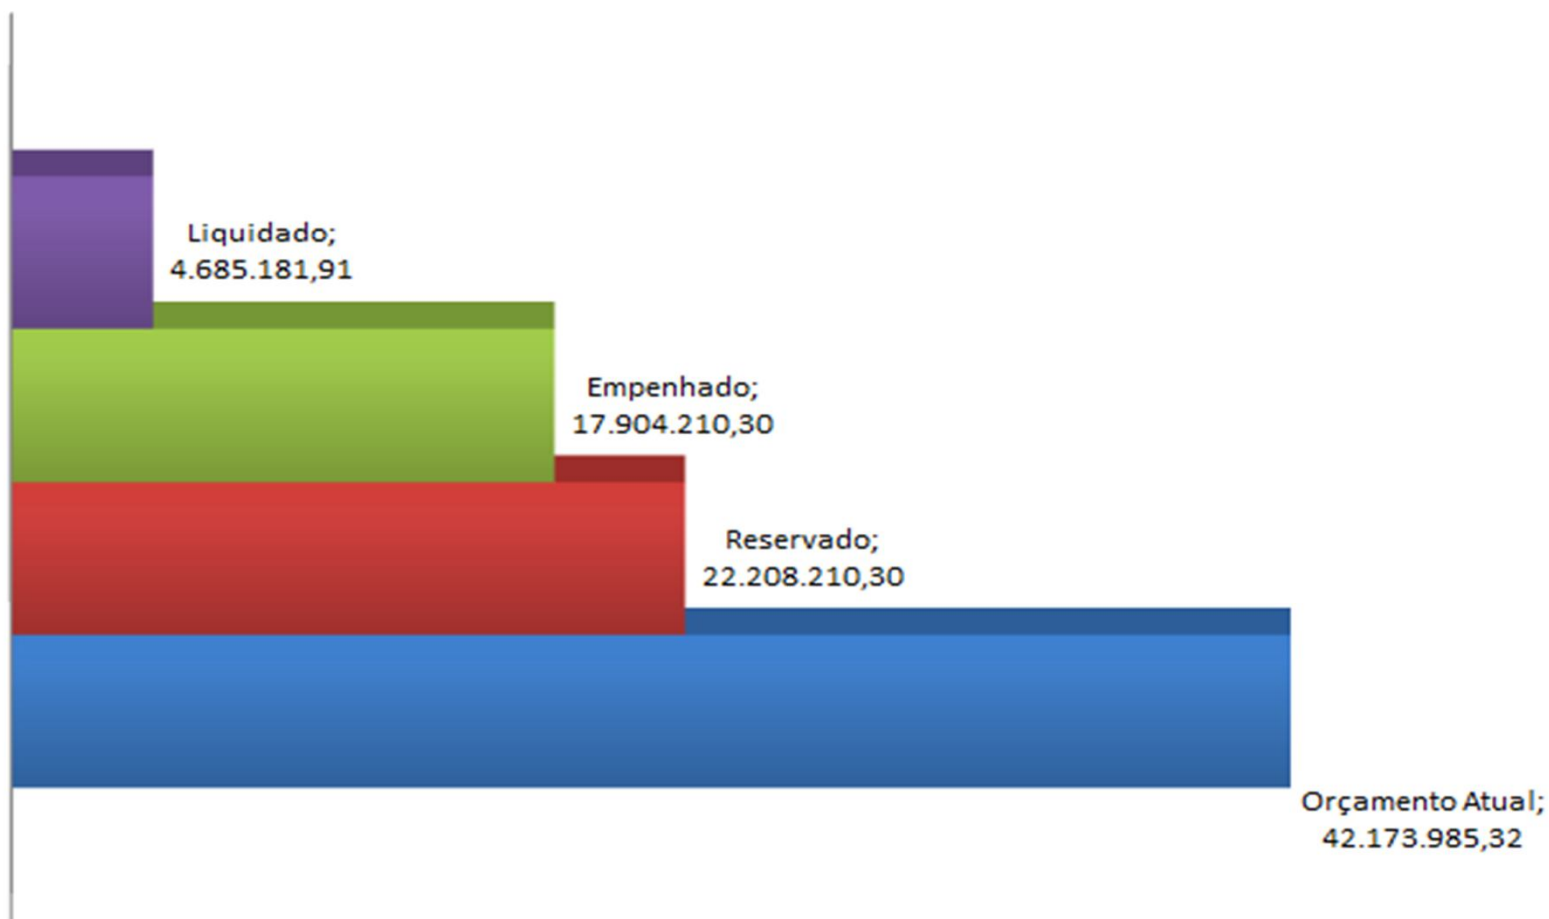

Controle Orçamentário da STI



Secretaria - Planejado x Executado

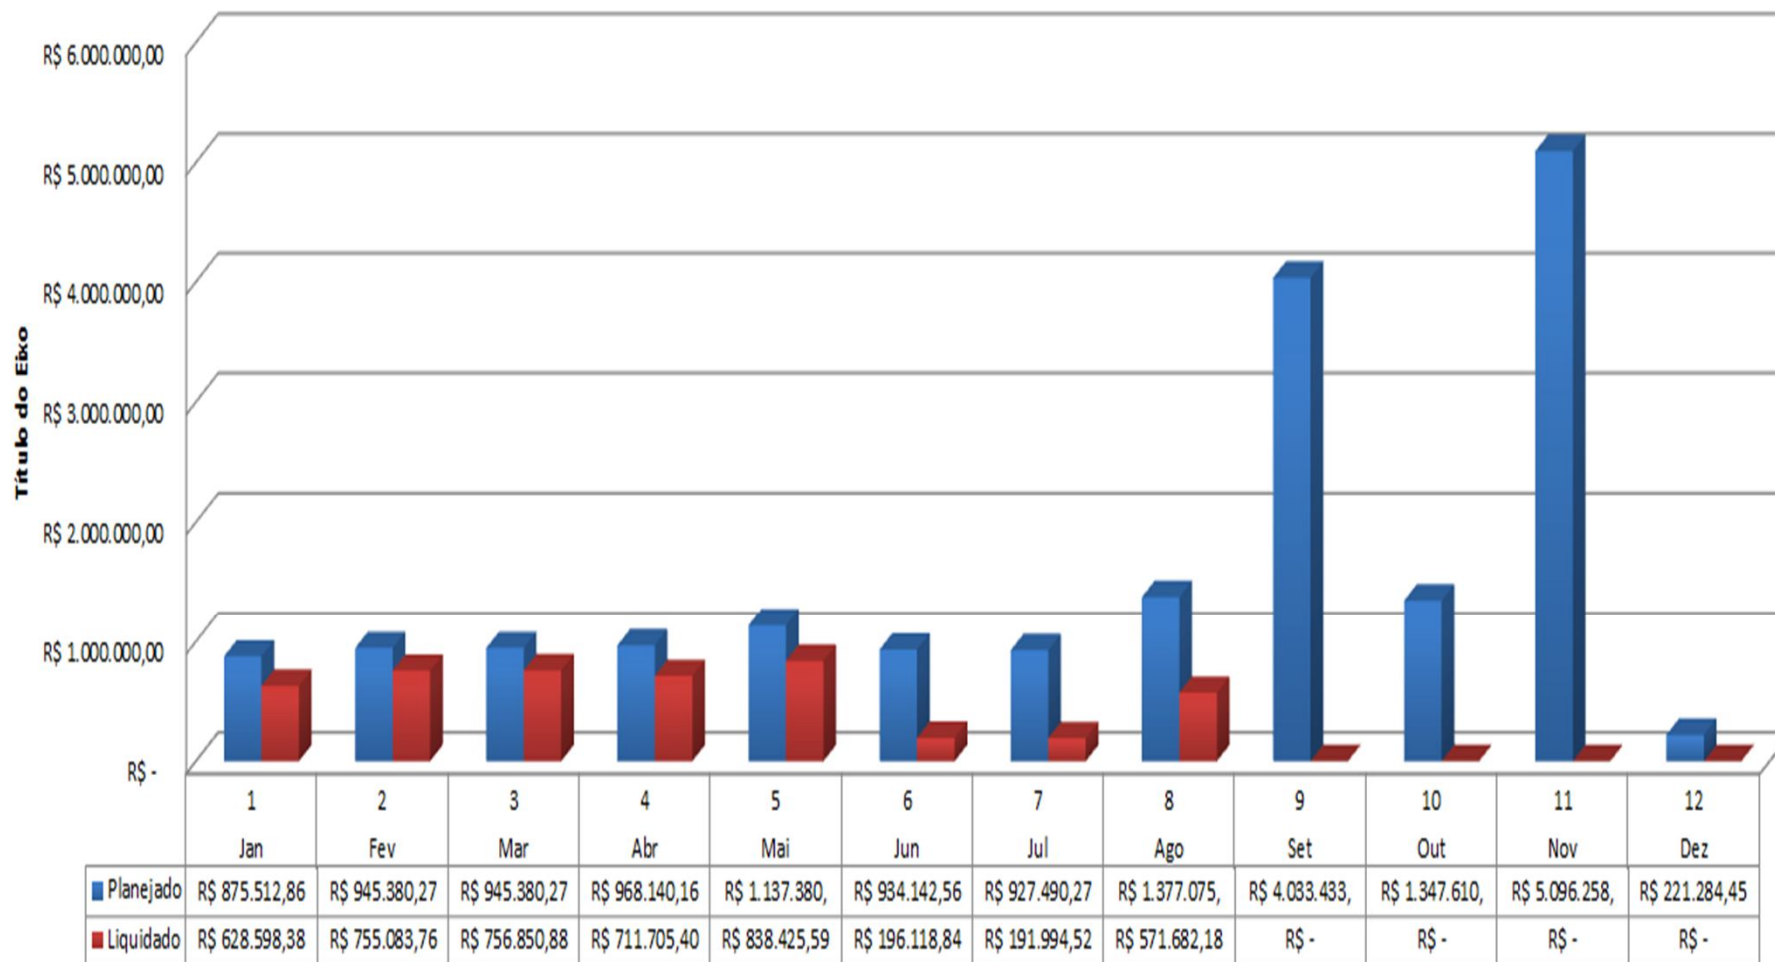



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

A background graphic featuring a central globe surrounded by several floating, semi-transparent rectangular blocks, suggesting a digital or data environment.

PMO STI Gerenciamento de Projetos

Projeto de Aquisição de Desktops

N° 2013.00.288.231



| Marco Crítico | Conclusão |
|--|--------------|
| Planejamento da Demanda | ● 08/04/2014 |
| Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI | ● 15/04/2014 |
| Termo de Referência elaborado | ● 09/05/2014 |
| Edital Publicado | ● 18/07/2014 |
| Contrato Assinado | 22/09/2014 |

| Entregas | 2014 |
|----------|------------|
| Desktop | PREV. 1000 |
| | REALIZ. - |

| Situação atual |
|---|
| Concluído Pregão Eletrônico em 22/08/2014 tendo como vencedora a empresa Positivo. Equipamento homologado em 29/08/2014. |

GERENTE DO PROJETO

Daniel Correia

INÍCIO

07/04/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

02/10/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

2.666.000,00

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Contratação de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Service Desk)

Nº2014.00.593.379



| Marco Crítico | Conclusão |
|--|--------------|
| Planejamento da Demanda | ● 14/05/2014 |
| Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI | ● 06/06/2014 |
| Termo de Referência elaborado | ● 07/07/2014 |
| Pregão Concluído | 22/09/2014 |
| Contrato Assinado | 06/10/2014 |

| Entregas | | 2015 |
|--|---------|------|
| Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços | PREV. | 1 |
| | REALIZ. | - |

Situação atual

Publicado Ato nº 202/2014 designando equipe de planejamento da contratação no dia 27/08/2014. Termo de Referência em fase de conclusão pela equipe técnica.

GERENTE DO PROJETO

Jaderson Falcão

INÍCIO

12/05/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

13/10//2014

TOTAL (R\$)

2.255.000,00

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Aquisição de Nobreak

Nº 2014.00.529.908



| Marco Crítico | Conclusão |
|--|--------------|
| Planejamento da Demanda | ● 17/06/2014 |
| Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI | ● 24/06/2014 |
| Termo de Referência elaborado | ● 28/07/2014 |
| Processo Protocolado | ● 24/07/2014 |
| Adesão ARP autorizada | 26/09/2014 |
| Contrato Assinado | 01/12/2014 |
| Emissão de Ordem de Serviço | 11/12/2014 |

| Entregas | | 2014 |
|----------|---------|------|
| Nobreaks | PREV. | 900 |
| | REALIZ. | - |

Situação atual

Encaminhado ao CNJ em 20/08/2014 o pedido de adesão a ARP pelo Secretario Geral. Aguardando retorno para andamento do processo.

GERENTE DO PROJETO

Vinicius Moraes

INÍCIO

30/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

12/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

300.600,00

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Aquisição de Licenças Novell

N° 2014.00.931.252



| Marco Crítico | Conclusão |
|--|--------------|
| Planejamento da Demanda | ● 07/08/2014 |
| Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI | ● 01/07/2014 |
| Termo de Referência elaborado | ● 01/08/2014 |
| Edital Publicado | 02/10/2014 |
| Contrato Assinado | 05/12/2014 |

| Entregas | 2014 |
|---|---------|
| Licenças Adquiridas para Regularização do Ambiente NOVELL | PREV. |
| | REALIZ. |

Situação atual

Processo será encaminhado para Secretaria Geral para publicação da equipe de contratação. Termo de Referência em fase de elaboração pela equipe técnica.

GERENTE DO PROJETO

Arthur Aguiar

INÍCIO

30/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

12/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

295.070,10

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Aquisição de Licenças Novell

N° 2014.00.931.252



| Lic | Qtde. | Uso |
|---|-------|---------------------|
| Novell Open Enterprise Server 1-User 1-Year Priority Maintenance MLA Option | 1.700 | 1.850 |
| GroupWise 1-User 1-Year Priority Maintenance | 1.130 | 1.015 |
| GroupWise WebAccess/Messenger 1-User 1-Year Priority Maintenance | 3.000 | 5.043 |
| ZENworks Configuration Management Advanced Edition 1-Year Priority Maintenance + 1-Year Patch Subscription | 616 | 1085 (dispositivos) |
| ZENworks Patch Management 11 1-Device 1-Year Cross-Platform Subscription | 550 | 1085 (dispositivos) |
| Novell Access Manager 1-User 1-Year Priority Maintenance | 6.000 | 9.262 |
| Novell Identity Manager Standard Edition 1-User 1-Year Priority Maintenance | 1.200 | |
| Novell Identity Manager Advanced Edition 1-User 1-Year Priority Maintenance | 5.500 | 10.501 |
| Novell Identity Manager Integration Module for Database 1-User 1-Year Priority Maintenance | 6.000 | |
| Novell Identity Manager Integration Module for Linux and Unix 1-User 1-Year Priority Maintenance | 50 | 62 |
| Sentinel Base Package 1-Instance 1-Year Priority Maintenance | 1 | 1 |
| SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel64 (1-2 CPU Sockets, Standard Support, 1 Physical, 1 Year) | 20 | |
| Novell Access Manager 1-User Government-to-Citizen/Business-to-Consumer 1-Year Priority Maintenance | 5.050 | 16.209 |
| Novell Identity Manager Advanced Edition Government-to-Citizen/Business-to-Consumer 1-User 1-Year Priority Maintenance | 5.000 | 16.284 |
| Novell Identity Manager Integration Module for Database Government-to-Citizen/Business-to-Consumer 1-User 1-Year Priority Maintenance | 5.000 | |
| Novell Identity Manager Integration Module for Tools Government-to-Citizen/Business-to-Consumer 1-User 1-Year Priority Maintenance | 1.000 | |

GERENTE DO PROJETO

Arthur Aguiar

INÍCIO

30/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

12/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

295.070,10

EXECUTADO (R\$)

-

Observações

Os campos em branco representam licenças que ainda não contabilizadas. A linha destacada em amarelo representa as licenças que devem ser "migradas" da versão Standard para a Advanced.

Aquisição de Impressora Multifuncional - Diário da Justiça

Nº 2014.00.088.659



| Marco Crítico | Conclusão |
|--|--------------|
| Planejamento da Demanda | ● 22/07/2014 |
| Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI | ● 06/06/2014 |
| Termo de Referência elaborado | ● 22/08/2014 |
| Edital Publicado | 31/10/2014 |
| Contrato Assinado | 05/01/2015 |

| Entregas | | 2015 |
|---------------------------|---------|------|
| Impressora Multifuncional | PREV. | 1 |
| | REALIZ. | - |

Situação atual

Processo encontra-se na Coordenadoria de Gestão da Informação Documental para elaboração dos demais documentos previstos na norma.
Previsão de conclusão do Termo de Referência: 05/09/2014.

GERENTE DO PROJETO

Tiago Nascimento

INÍCIO

21/04/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

15/01/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

200.000,00

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Aquisição de Licenças de Software Telefonia e voz IP - N°2014.00.684.569



| Marco Crítico | Conclusão |
|--|--------------|
| Planejamento da Demanda | ● 07/08/2014 |
| Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI | ● 15/07/2014 |
| Termo de Referência elaborado | ● 01/08/2014 |
| Edital Publicado | 07/11/2014 |
| Contrato Assinado | 05/12/2014 |
| Emissão de Ordem de Serviço | 12/12/2014 |

| Entregas | | 2015 |
|-------------------------|---------|------|
| Aparelhos IP e Licenças | PREV. | 36 |
| | REALIZ. | - |

Situação atual

Recebido carta de exclusividade do fornecedor SOPHO em 18/08/2014 para análise do processo de contratação por inexigibilidade. Em virtude desse novo cenário os documentos serão refeitos pela equipe técnica.

GERENTE DO PROJETO

Vinicius Moraes

INÍCIO

30/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

12/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

150.000,00

EXECUTADO (R\$)

-

Aquisição de Impressora de Crachá - Segurança Institucional n° 2014.00.624.629



| Marco Crítico | Conclusão |
|--|--------------|
| Planejamento da Demanda | ● 19/05/2014 |
| Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI | ● 06/06/2014 |
| Termo de Referência elaborado | ● 22/08/2014 |
| Edital Publicado | 31/10/2014 |
| Contrato Assinado | 05/01/2014 |

| Entregas | | 2014 |
|----------------------|---------|------|
| Impressora de crachá | PREV. | 1 |
| | REALIZ. | - |

Situação atual

Processo encontra-se na Assessoria de Segurança Institucional para elaboração dos demais documentos previstos na norma.

GERENTE DO PROJETO

Nelson Lara Junior

INÍCIO

21/07/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

15/01/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

EXECUTADO (R\$)

-

Aquisição de Licenças AUTOCAD – nº 2014.00.555.286



| Marco Crítico | Conclusão |
|--|--------------|
| Planejamento da Demanda | ● 09/06/2014 |
| Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI | ● 06/06/2014 |
| Termo de Referência elaborado | ● 25/07/2014 |
| Edital Publicado | 03/10/2014 |
| Contrato Assinado | 08/12/2014 |

| Entregas | 2014 |
|----------|-----------|
| Licenças | PREV. 17 |
| | REALIZ. - |

Situação atual

Processo encontra-se na Assessoria Jurídica da STI para análise dos documentos previstos na norma.

GERENTE DO PROJETO

Paulo Santos

INÍCIO

23/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

18/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

160.000,00

EXECUTADO (R\$)

-



Custas Processos Administrativos

Lei nº 9974 DE 09/01/2013

Dispõe sobre o Regimento de Custas e adota outras providências.



- Demanda
- Utilização no mercado
- Tecnologias
- Custo
- Plano de contratação



- Fórum Vitória
 - Prédio antigo e sem tubulação
 - Projeto de reestruturação da engenharia
 - Mudança de layout
- TJES
 - Mobilidade servidores e Magistrado(note, celular)
 - Rede visitantes
 - Mudança de layout



- **Redes MESH**
- **Facilidade de configuração.**
- **Resiliência e expansão.**
- **Segurança.** Buscar por padrões e protocolos que tornem a rede wireless tão segura quanto a rede com fio. Uma rede wireless deve oferecer segurança robusta como criptografia de dados, para proteger as informações transmitidas pela rede; autenticação de usuários, o que identifica computadores que tentam acessar a rede e proteger o acesso para visitantes e convidados.



- 802.11n
 - Lançamento em 2003
 - Padrão mais utilizado
 - Velocidade 150 Mbps ~ 17.88 MB/s



- 802.11ac
 - é o que há de mais novo em wireless.
 - Próxima mudança fundamental no protocolo 802.11
 - Velocidade em Gigabit.
 - Em 2014, a adoção do ponto de acesso (AP) 802.11ac crescerá, levada principalmente pela existência de mais de dispositivos com 802.11ac habilitados e também por fabricantes lançando 2 x 2 802.11ac APs de menor custo.
 - Uma infraestrutura do tipo otimizada dependerá de fundamentos sólidos de wireless, design de rádio, sistemas inteligentes de antenas e adaptação dinâmica de radiofrequência.



Pesquisa de editais

TRE/PB, TRT/RJ, TJ/GO, TCU

Notícias

TJ implanta rede wireless (sem fio) em 56 comarcas - 17/out/2006

Experiências

TRT/RJ

TJ/GO

Custo rede wifi corporativa



Baseado na estimativa contratação TJ/GO - 2014

| LOTE 01 (UNICO) | ITEM | DESCRIÇÃO |
|--------------------|---------|---|
| | Item 01 | Controladores de rede sem fio (Wireless Controlllers) e seus acessórios |
| | Item 02 | Access Points |
| | Item 03 | Fontes de Energia |
| | Item 04 | Treinamento |

| LOTE 01 (UNICO) | Item | Quantidade | Valor unitário estimado (R\$) | Valor total estimado (R\$) |
|--------------------|---------|------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Item 01 | 02 | R\$ 256.479,95 | R\$ 512.959,90 |
| | Item 02 | 150 | R\$ 5.738,05 | R\$ 864.486,00 |
| | Item 03 | 75 | R\$ 325,40 | R\$ 24.405,00 |
| | Item 04 | 02 | R\$ 12.616,22 | R\$ 25.232,44 |
| | Total | - | - | R\$ 1.423.305,34 |



- Site Survey
 - assegurar que o número, localização e configuração dos pontos de rede forneçam as funcionalidades requeridas e propiciem um desempenho compatível com o investimento proposto no projeto
- Criação termo de referência
- Licitação
- Implatação



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

STI

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

29/08/2014
