

RAde



**Reunião Administrativa
da Estratégia**

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - Pjes

6^a RAdE





Sumário

- Introdução
- Desempenho do PJES
- Desempenho das Reuniões da Estratégia
- Apresentações
- Considerações Finais

VISÃO – “Ser uma instituição que promove a justiça para todos com credibilidade e gestão de excelência”

MISSÃO – “Assegurar a todos, indistintamente, a solução adequada dos conflitos apresentados à justiça Capixaba de forma acessível, célere e efetiva, contribuindo para a promoção da paz social e fortalecimento do Estado Democrático de Direito”

SOCIEDADE

Garantia de acesso à justiça

Solução das demandas de forma efetiva, adequada e em tempo razoável

PROCESSOS

Desenvolver a tramitação dos processos judiciais com efetividade

Elevar a produtividade do Poder Judiciário

Estruturar o sistema de meios alternativos de solução de conflitos

Gerenciar as demandas repetitivas de grandes litigantes

Otimizar e incrementar as possibilidades de acesso à justiça

Aprimorar o relacionamento com o jurisdicionado, operadores do direito e a sociedade

Implantar a Governança Judiciária

Combater a corrupção e a improbidade

Implantar a Governança de TI

PESSOAS

Implantar o modelo de gestão de pessoas por competência

ORÇAMENTO E INFRAESTRUTURA

Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas

Disponer de infraestrutura que satisfaça as exigências operacionais


Otimizar a aplicação dos recursos financeiros

Implantar gestão de custos


Incrementar os recursos do Poder Judiciário

DESEMPENHO DO PJES

Taxa de Congestionamento




Sentenças por Magistrado



Média da Justiça Estadual 2015 : 1973


◆ SM – Sentenças por Magistrado

Índice de Produtividade




—◆— IPM – Índice de Produtividade dos Magistrados

Índice de Produtividade

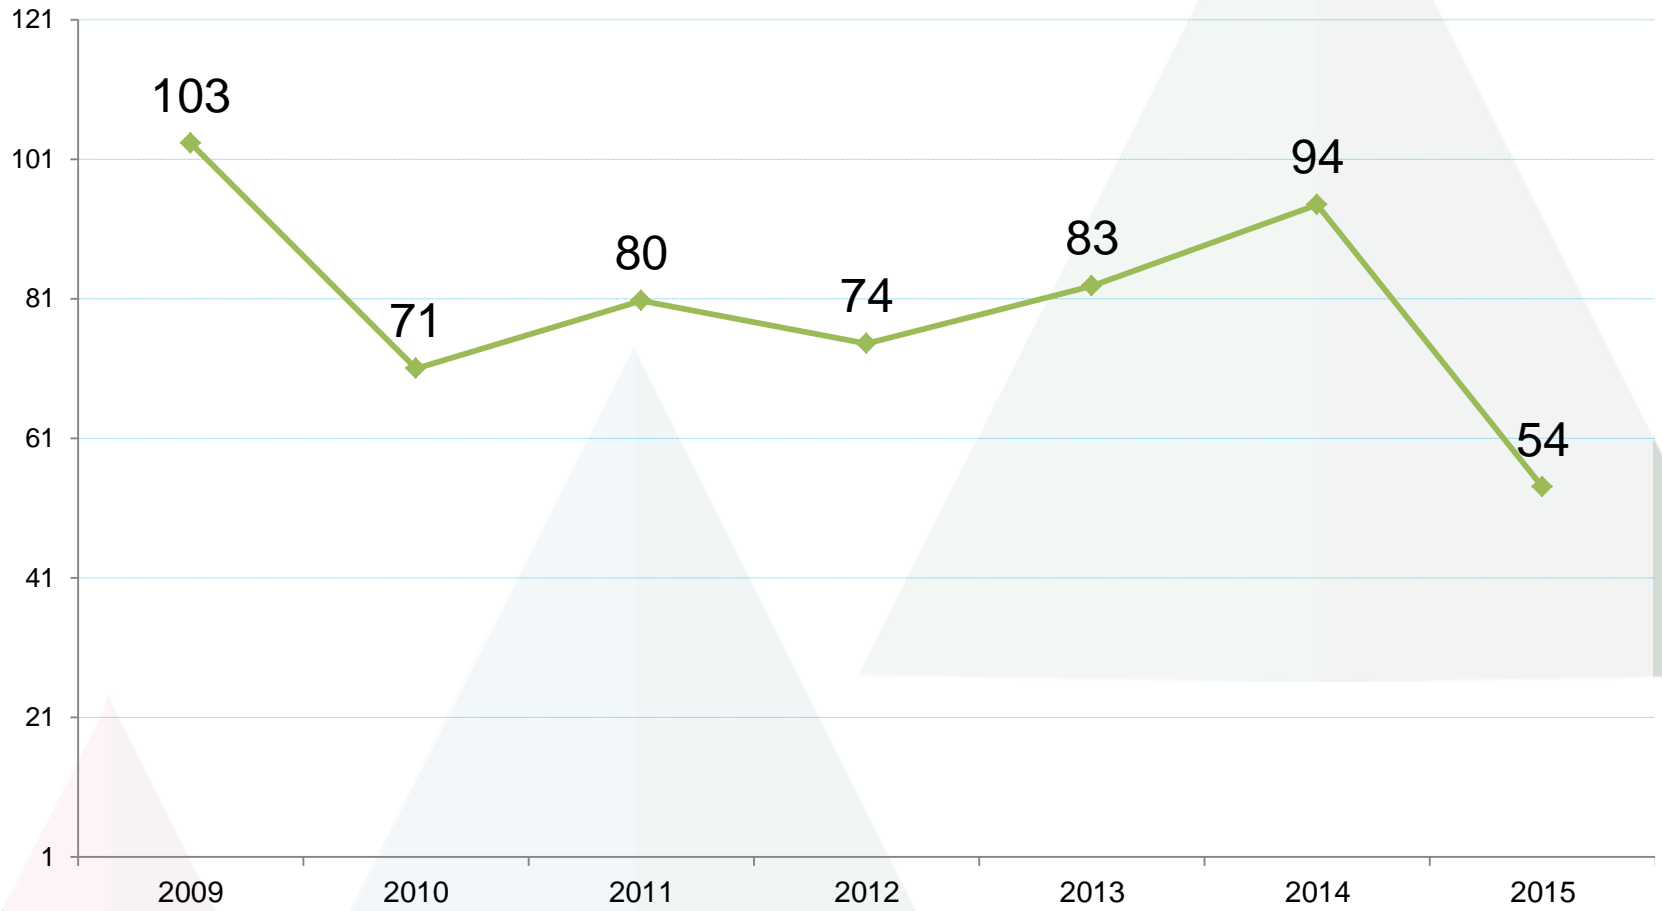

◆ IPS - Índice de Produtividade dos Servidores


Movimentação Processual

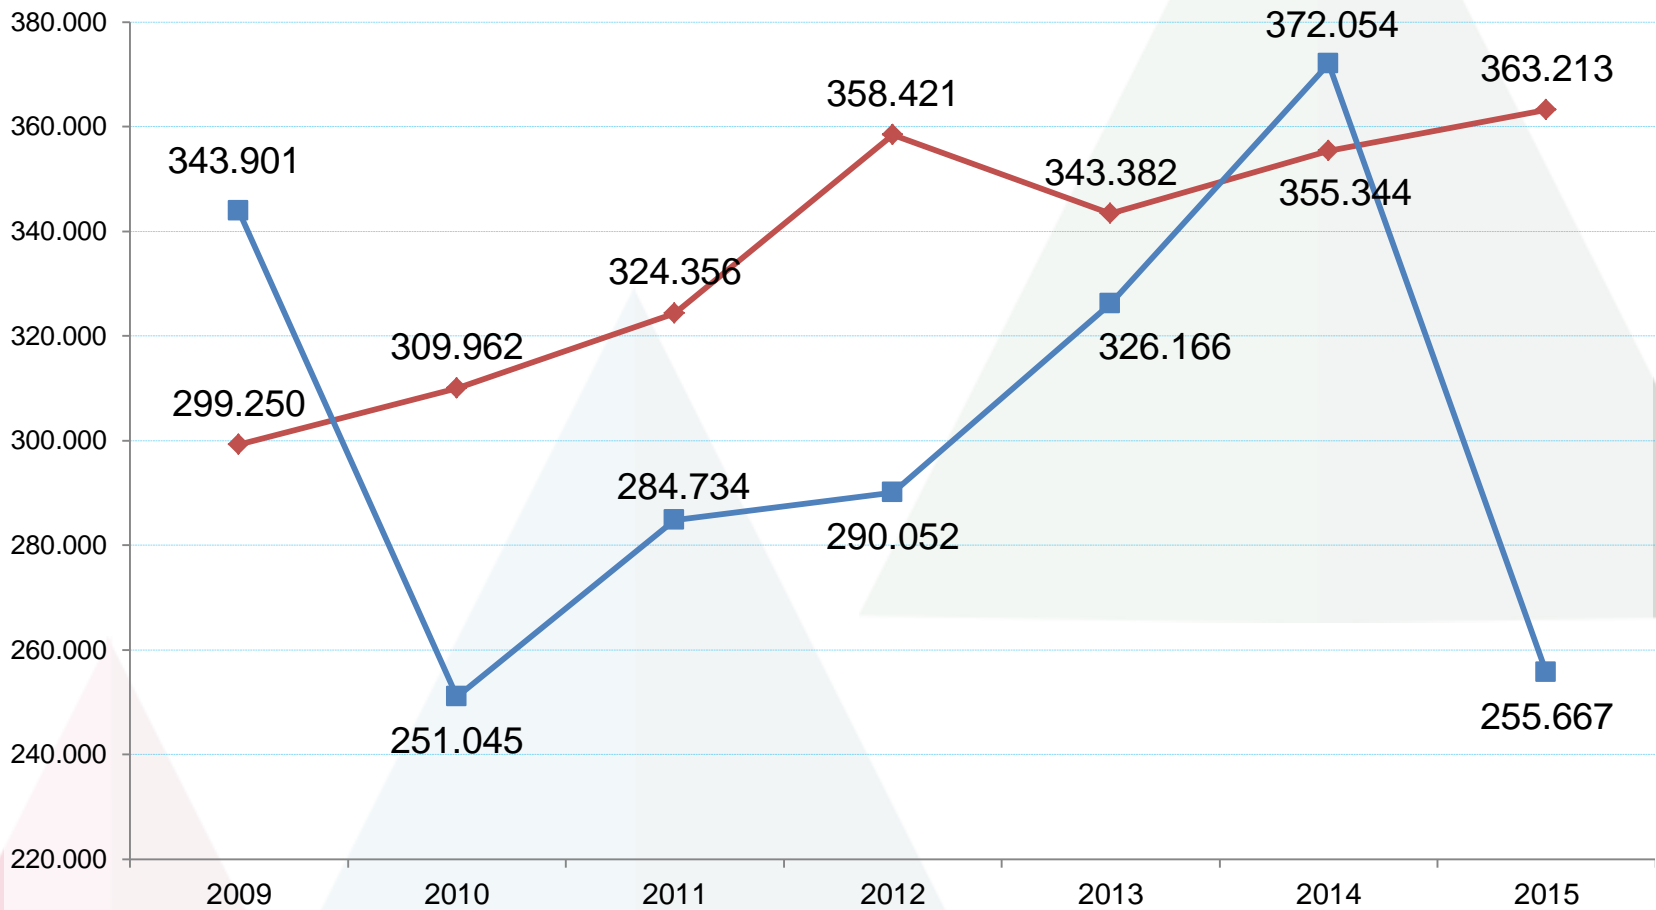

—◆— Cn - Casos Novos

—■— T Baix - Total de Processos Baixados

ACERVO

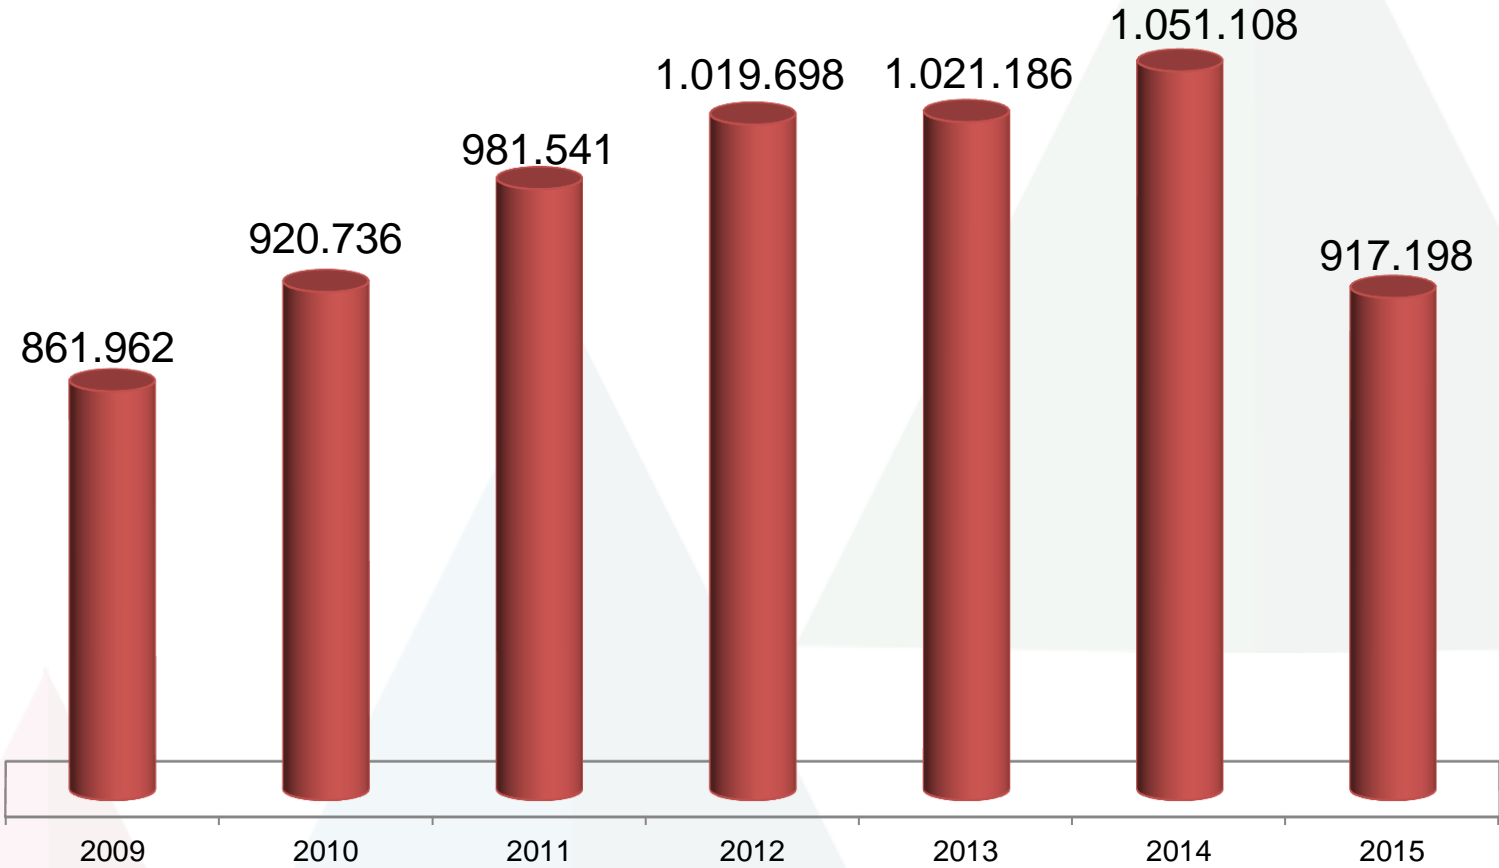


■ Cp – Casos Pendentes




DESEMPENHO DAS REUNIÕES DE ESTRATÉGIA




AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS PROJETOS E INDICADORES

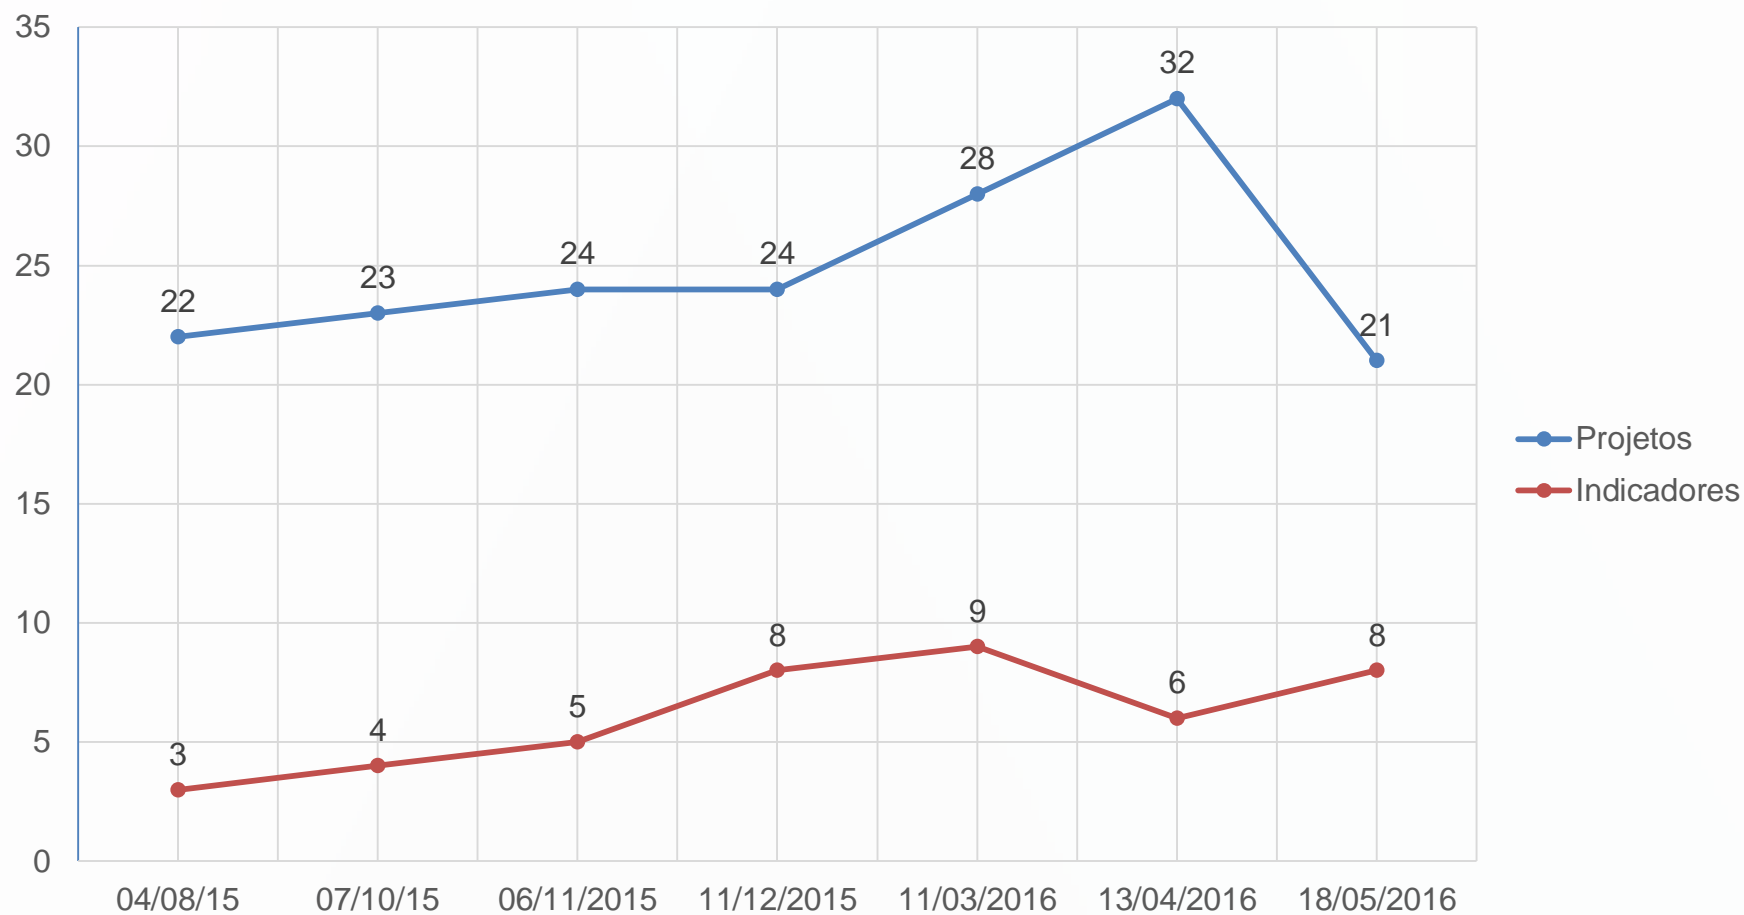


Áreas que apresentaram

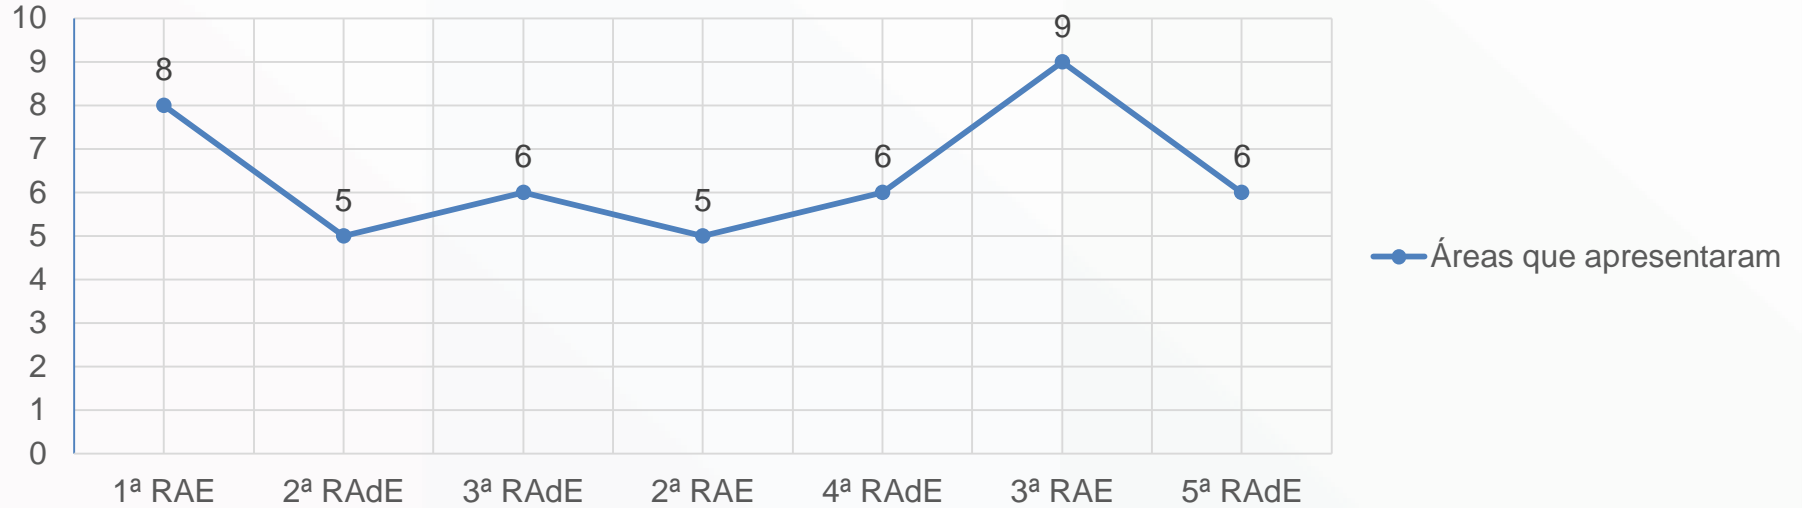

Dos projetos apresentados

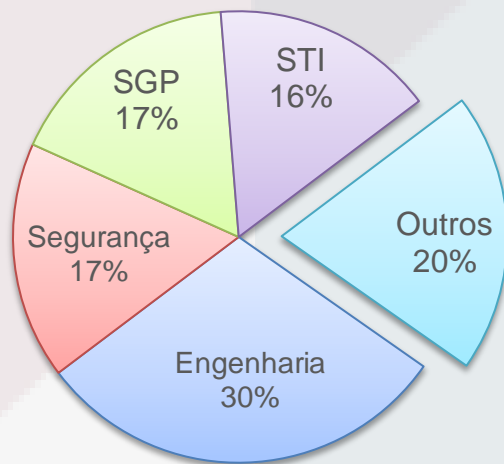

Dos indicadores apresentados





APRESENTAÇÕES




NUPEMEC

PROJETO CRIAR E IMPLANTAR CEJUSCs

RAde nº 06-2016

Descrição	Criar e implantar CEJUSCs em 12 (doze) Comarcas do Estado, 01 (um) itinerante e 01 (um) CEJUSC em 2º grau a fim de que seja cumprida na íntegra a Res.125/10, Meta 3 do CNJ, Lei da Mediação e que atenda ao novo Código de Processo Civil.
Iniciativa	Estruturar os meios alternativos de solução de conflitos.
Término	19/12/2016

Gerente	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE
Unidade	NUPEMEC
Gestor	DESª.JANETE V. SIMÕES
Custo total	0
Executado	0



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Publicação do Ato autorizando a instalação do CEJUSC de Colatina
- Minuta de ato criando CEJUSC Itinerante, entregue à Presidência, que atuará ligado à Justiça Comunitária, Minuta de ato criando CEJUSC de 2º grau
- 2 cursos de Mediação Judicial agendados para o 2º semestre com total de 48 vagas disponíveis.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Providenciar funcionamento do CEJUSC de Colatina ampliando as Comarcas de abrangência (08/2016).
- Planejamento de instalação de CEJUSC em Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim até 10/2016.

PENDÊNCIAS

- Necessidade de autorização para capacitação na parte teórica.
- Publicação de Minuta de ato regulamentando as atividades do NUPEMEC e dos CEJUSCs

AÇÕES PROPOSTAS

- Concentrar esforços para capacitar na parte teórica e prática, a maior quantidade possível de mediadores judiciais para atuarem nos CEJUSCs
- Buscar locais para instalação e/ou parcerias para funcionamento dos CEJUSCs

PROJETO **Conciliação envolvendo Execuções Fiscais Municipais no Estado do ES**

RAde nº 06-2016

Descrição Difundir o cumprimento da Lei Federal 9492/97, promovendo ações extrajudiciais de forma a conter a crescente judicialização dos processos e ações de conciliação judicial para diminuir o acervo de Execução Fiscal em tramitação

Gerente **PAULA MORGADO HORTA MONJARDIM CAVALCANTI**

Unidade NUPEMEC

Gestor DES^a.JANETE V. SIMÕES

Iniciativa Implementar Cultura de Pacificação Social

Custo total 0

Término 19/12/2016

Executado 0



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião com Grupo de Trabalho de Execução Fiscal e Ministério Público de Contas (adiada por falta de disponibilidade do palestrante)
- Realização de Mutirão em Viana com 218 audiências gerando R\$ 986.000,00 em acordos parcelados e à vista.
- Análise de dados dos processos de Execução Fiscal pelo Setor de Estatística

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Treinamento Prático das Turmas 3 e 4 e Esmages nestes processos.
- Envolver o Ministério Público no projeto.

PENDÊNCIAS

- Estruturação dos CEJUSC's

AÇÕES PROPOSTAS


- Estruturar CEJUSC's
- Formação Teórica e Prática em Mediação/ conciliação Judicial

PROJETO **Mediação Judicial nas Varas de Família**

RAde nº 06-2016

Descrição	Difundir o tratamento adequado de Conflitos de interesse nas Varas de Família, em cumprimento a Resolução 125/2010, Lei de Mediação e Novo Código de Processo Civil
Iniciativa	Implementar Cultura de Pacificação Social
Término	19/12/2016

Gerente	PAULA MORGADO HORTA MONJARDIM CAVALCANTI
Unidade	NUPEMEC
Gestor	DESª.JANETE V. SIMÕES
Custo total	0
Executado	0



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- 1ª Ação de Mediação de Família com resultado final de 86% de acordos, envolvendo 64 mediadores em formação.
- Reunião com Grupo de Trabalho e avaliação dos resultados
- Publicação do ato nº 74/2016 para realização da 2ª Ação de Mediação de Família, que ocorrerá de 15 de agosto a 02 de setembro de 2016.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

Recebimento, separação e marcação de Sessões de Mediação nos processos para tratamento na 2ª Ação de Mediação de Família
- Realização da 2ª ação de Mediação de Família de 15 de agosto a 02 de setembro, na EMES. 240 processos, envolvendo 64 mediadores em formação. (treinamento prático das turmas 3 e 4 e ESMAGES)

PENDÊNCIAS

- Estruturação dos CEJUSC's

AÇÕES PROPOSTAS

- Estruturar CEJUSC's
- Formação Teórica e Prática em Mediação Judicial de Família

ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

PROJETO **Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras (2013.00.857.998)**

Descrição Aquisição de Sistema de monitoramento por câmeras instaladas em locais de acesso e sensíveis, interligados com a Central de monitoramento do TJES em 21 unidades.

Iniciativa 8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

Término 31/Dez/2015

RAde nº 06-2016


Gerente Bruno Santos Campos

Unidade Unidade do PJES

Gestor Anderson Perciano Faneli

Custo total R\$3.397.007,65

Executado R\$1.062.879,21



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Recebimento provisório de parcela da solução (Mar/2016).
- Designação do Fiscal Técnico de TI.
- Análise das parcelas entregues pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Realização de ajustes e correções para Recebimento definitivo da parcela pendente da solução (Jun/2016)
- Acompanhamento da Operação Assistida.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR

TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de monitoramento por câmeras e seu adequado funcionamento;

Responsável

Anderson Perciano Faneli

Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 22/Jun/2016

MEDIÇÃO 30%

META 15%


STATUS



PRÓXIMA 01/Jul/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	15%	30%
2017	30%	-
2018	45%	-
2019	60%	-
2020	70%	-

INDICADOR 1

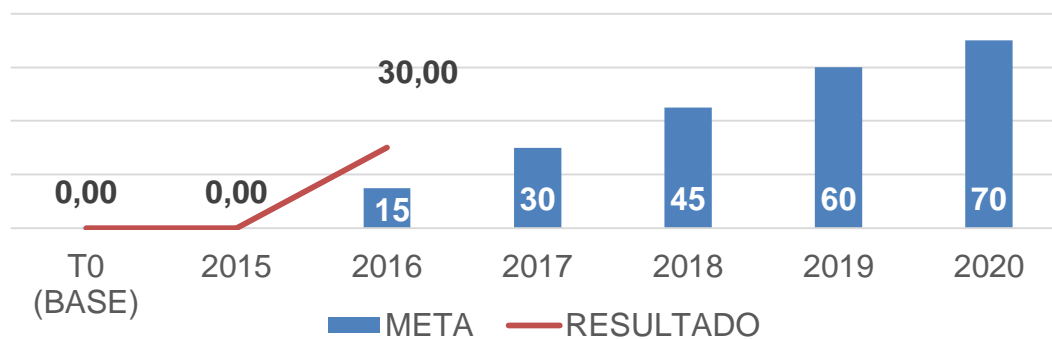

AVALIAÇÃO

- 21 sistemas de monitoramento foram entregues este semestre.

AÇÕES PROPOSTAS

- Acompanhar o andamento dos projetos relacionados ao indicador.

PROJETO **Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso (2015.00.276.430)**

Descrição Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso para as unidades judiciárias interligados com a Central de monitoramento do TJES em 12 unidades.

Iniciativa 8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

Término 31/Dez/2017

RAde nº 06-2016


Gerente **Bruno Santos Campos**

Unidade Assessoria de Segurança Institucional

Gestor Anderson Perciano Faneli

Custo total R\$5.292.576,55

Executado R\$0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Finalização dos formulário de TI (IN 04).

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Revisão dos formulários pela Secretaria de Tecnologia da Informação
- Realização de nova cotação.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Solicitação de previsão orçamentário para o ano de 2017.

INDICADOR

TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE CREDENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO.

Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso e seu adequado funcionamento.

Responsável

Bruno Santos Campos

Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais


ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 22/Jun/2016

MEDIÇÃO 0

META -


STATUS



PRÓXIMA 01/Jul/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	10%	-
2017	20%	-
2018	30%	-
2019	40%	-
2020	50%	-

INDICADOR 2

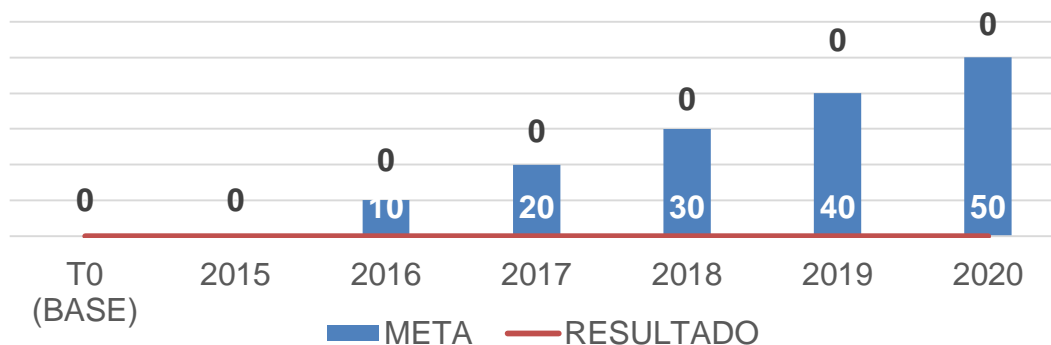

AValiação

- Nenhum sistema de credenciamento e controle de acesso fora contratado até o momento.

Ações Propostas

- Acompanhar o andamento do projeto relacionado ao indicador (previsão de execução em 2017).

PROJETO **Aquisição de Sistema de Detecção de Metais (2016.00)**

RAde nº 06-2016

Descrição

Aquisição de Sistema de Detecção de Metais para 34 unidades judiciárias.

Iniciativa

8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

Término

30/Nov/2016

Gerente

Kaio Fardim

Unidade

Assessoria de Segurança Institucional

Gestor


Anderson Perciano Faneli

Custo total

R\$478.000,00

Executado

R\$0,00



STATUS

ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração do Termo de Referência.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Definição da normatização de uso e do quantitativo de aparelhos.
- Realização de cotação de mercado.

PENDÊNCIAS

- Definição da normatização de uso e do quantitativo de aparelhos.

AÇÕES PROPOSTAS

- Realização de reunião com a presidência para definição das questões pendentes.

INDICADOR

TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE DETECÇÃO DE METAIS IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de Detecção de Metais e seu adequado funcionamento;

Responsável

Kaio Fardim

Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais


ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 22/Jun/2016

MEDIÇÃO 0

META -


STATUS



PRÓXIMA 01/Jul/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	10%	-
2017	20%	-
2018	30%	-
2019	40%	-
2020	50%	-

INDICADOR 4

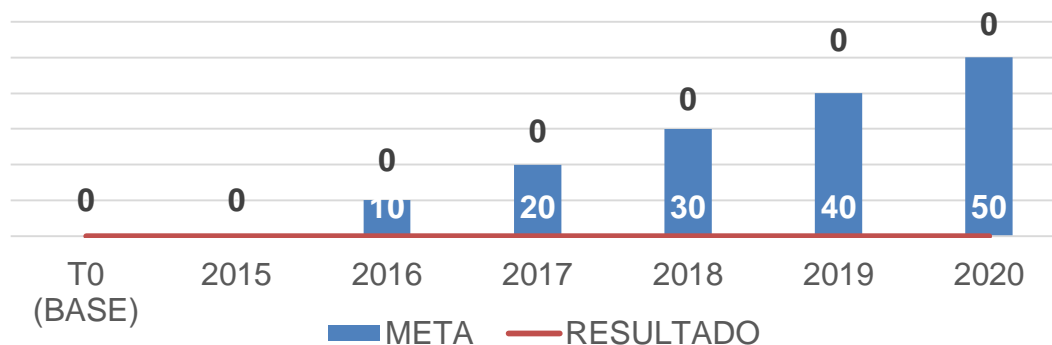

AVALIAÇÃO

- Nenhum sistema de detecção de metais fora contratado até o momento.

AÇÕES PROPOSTAS


- Acompanhar o andamento dos projetos relacionados ao indicador.

PROJETO **Confecção de Crachás de Identificação para servidores, magistrados e estagiários**

RAde nº 06-2016

Descrição	Desenvolvimento e operação de ferramenta de confecção de crachás de identificação para magistrados, servidores e estagiários do PJES.
Iniciativa	8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.
Término	01/Jun/2017

Gerente	Kaio Fardim
Unidade	Assessoria de Segurança Institucional
Gestor	Anderson Perciano Faneli
Custo total	R\$0,00
Executado	R\$0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Finalização do desenvolvimento do software pela STI
- Fase de testes finais do software pela Assessoria de Segurança

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Liberação do sistema aos usuários pela STI.
- Elaboração da cartilha de orientação para requisição dos crachás e atualização dos atos normativos.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

--	--

INDICADOR

QUANTITATIVO DE SERVIDORES, MAGISTRADOS E ESTAGIÁRIOS COM CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição Percentual que indica o percentual de magistrados, servidores e estagiários do PJES que possuem o crachá de identificação;

Responsável Bruno Santos Campos

Objetivo 5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 22/Jun/2016

MEDIÇÃO 0

META -


STATUS



PRÓXIMA 01/Jul/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	30%	-
2017	60%	-
2018	100%	-
2019	100%	-
2020	100%	-

INDICADOR 4

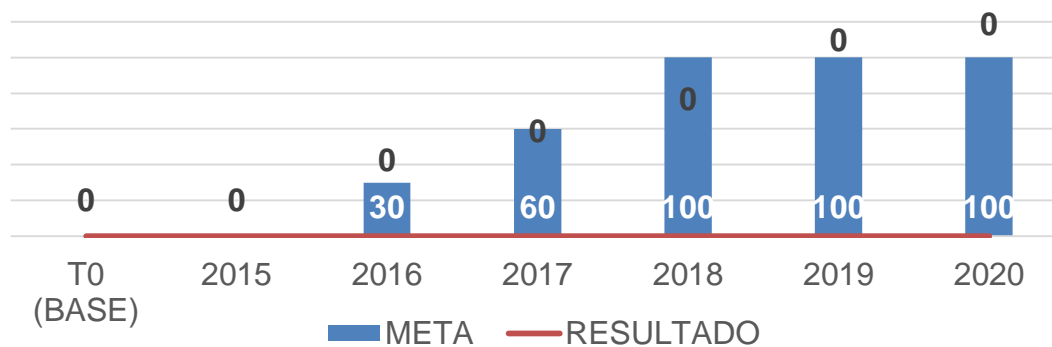

AVALIAÇÃO

- A confecção ainda não foi iniciada.

AÇÕES PROPOSTAS

- Realizar os últimos preparos e iniciar a confecção.



Reunião Administrativa
da Estratégia

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PIES

SECRETARIA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PROJETO Reforma do Fórum de Guarapari

RAde nº 06-2016

Descrição Reforma geral do Fórum de Guarapari para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa
- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/07/2017


Gerente Erica Crevelin Valentim

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 2.263.114,15

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Licitação;
- Nomeação dos gestores;
- Empenho;
- Assinatura do contrato.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Emissão da Ordem de serviço: Julho/2016
- Execução da obra prevista: Julho/2017

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO Reforma geral do Fórum de Vila Velha (Prainha)

RAde nº 06-2016


Descrição Reforma da geral do Fórum de Vila Velha (Prainha) para melhorar as condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 20/12/2018

Gerente Eliane Barbarioli Santi
Unidade Secretaria de Engenharia
Gestor Wagner Oliveira Marques
Custo total R\$ 1.800.000,00
Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Definição do escopo da reforma da cobertura;
- Projetos da cobertura em fase final: previsão 18/07.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Memoriais e planilha (cobertura): 07/16 a 10/16
- Licitação (cobertura): 10/16 a 03/17
- Execução da obra (cobertura): 04/17 a 09/17
- Projetos (reforma geral): 08/16 a 12/16
- Memoriais e planilha (reforma geral): 12/16 a 05/17
- Licitação (reforma geral): 05/17 a 11/17
- Execução da obra (reforma geral): 12/17 a 12/18

PENDÊNCIAS

- Alteração do Plano de Obras.

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO Reforma do Fórum de Baixo Guandú

RAde nº 06-2016

Descrição Reforma geral do Fórum de Baixo Guandú para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa
- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/10/2017


Gerente Angela Thereza C. de Almeida

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 900.000,00

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Revisão final do TR para nova contratação do projeto de reforço da fundação.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Cotação no setor de Compras.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo

RAde nº 06-2016

Descrição Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa
- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/07/2017


Gerente Reginaldo Augusto de Oliveira

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 1.500.000,00

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Definição do escopo do projeto;
- Projetos suspensos.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Contratação de ATA de projetos para desenvolvimento de projetos de médio e grande porte.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO Estabelecer nova estrutura física para o CAJE

Descrição Viabilizar a instalação de um centro para reunir o Colegiado Recursal e todos os juizados especiais, cíveis e criminais, da Comarca de Vitória.

Iniciativa Estabelecer nova estrutura física para o CAJE, englobando todas as unidades judiciárias do sistema de juizados especiais de Vitória.

Término 18/12/2015

RAde nº 06-2016


Gerente Raffaella Lage C. Oliveira

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 950.000,00 / ano - locação

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Equipamentos de ar condicionado em PLENO funcionamento.
- Recebimento definitivo do imóvel: 19/05/16.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO **Mudança do Fórum de Vitória**

RAde nº 06-2016

Descrição Estudo de viabilidade para transferência do Fórum de Vitória para outra edificação, a fim de proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Gerente **Raffaela Lage C. Oliveira**

Unidade Secretaria de Engenharia


Gestor Wagner Oliveira Marques

Iniciativa Estabelecer nova estrutura física para o Fórum de Vitória.

Custo total R\$ 2,3 milhões /ano - locação

Término 31/10/2018

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de Projeto Básico para locação de um imóvel para abrigar 09 Unidades Judiciárias do Fórum Cível;
- Chamamento público para locação;

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Escolha do imóvel ofertado: 2 imóveis para abrigar todo Fórum Cível;
- Projeto de reforma do Fórum Cível;
- Cessão do prédio da antiga Justiça Federal.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Contratação de ATA de projetos para desenvolvimento de projetos de médio e grande porte.

PROJETO **Mudança de unidades judiciárias do Fórum da Serra**

RAde nº 06-2016

Descrição Transferência de algumas unidades judiciárias do Fórum da Serra para outra edificação, proporcionando melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/07/2016


Gerente **Raffaela Lage C. Oliveira**

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 1 milhão / ano - locação

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Seção de imóvel da Prefeitura da Serra;
- Chamamento público para locação de imóvel menor para abrigar algumas varas da Comarca;

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Aguardando a definição da alta administração.

PROJETO Reforma do galpão do patrimônio e almoxarifado (TJES)

RAde nº 06-2016

Descrição

Reforma no galpão do patrimônio e almoxarifado para proporcionar melhorias nas condições de trabalho, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término

31/03/2017

Gerente

Eliane Barbarioli Santi

Unidade

Secretaria de Engenharia

Gestor


Wagner Oliveira Marques

Custo total

R\$ 150.000,00

Executado

R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de projeto arquitetônico;
- Memorial Descritivo e Projeto Básico;
- Projeto de incêndio;
- Projeto estrutural;
- Projeto hidro-sanitário.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- **Mudança na estratégia:** será realizado novo chamamento para locação de imóvel para o Arquivo Geral e o imóvel de Gurigica passará por uma reforma para abrigar o Almoxarifado e Patrimônio.
- Elaboração de projeto arquitetônico para nova destinação do imóvel.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO **Acessibilidade de João Neiva**

RAde nº 06-2016

Descrição Reforma para promover a acessibilidade no Fórum.

Gerente **Reginaldo de Oliveira**

Unidade Secretaria de Engenharia


Iniciativa
- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 150.000,00

Término 31/05/2017

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Elaboração de projeto de acessibilidade: em andamento.
- Memorial Descritivo e Projeto Básico;
- Licitação

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR **Quantidade de reformas de grande porte**

Descrição Número de reformas de grande porte (acima de 1,5 milhão de reais) executadas de acordo com a Resolução nº 114/2010 - Plano de Obras

Responsável Wagner Oliveira Marques

Objetivo Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 22/06/2015

MEDIÇÃO 1

META -


STATUS



PRÓXIMA 30/09/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	1	1
2016	2	-
2017	2	-
2018	2	-
2019	2	-
2020	2	-

INDICADOR – Reformas de grande porte

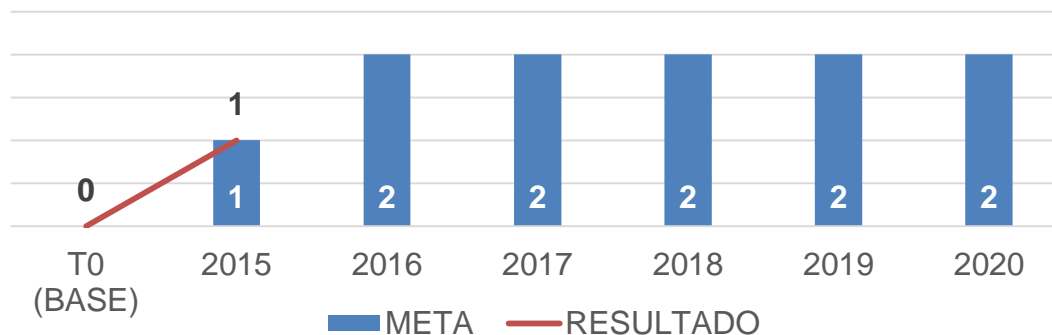

AVALIAÇÃO

- Obras para 2016: 1) Nova subestação do TJ;
2) Reforma geral de Guarapari.

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR **Quantidade de reformas de médio porte**

Descrição Número de reformas de médio porte (de 150 mil até 1,5 milhão de reais) executadas de acordo com a Resolução nº 114/2010 - Plano de Obras

Responsável Wagner Oliveira Marques

Objetivo Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 22/06/2015

MEDIÇÃO 1

META -


STATUS



PRÓXIMA 30/09/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	2	2
2016	2	-
2017	2	-
2018	1	-
2019	1	-
2020	2	-

INDICADOR – Reformas de médio porte

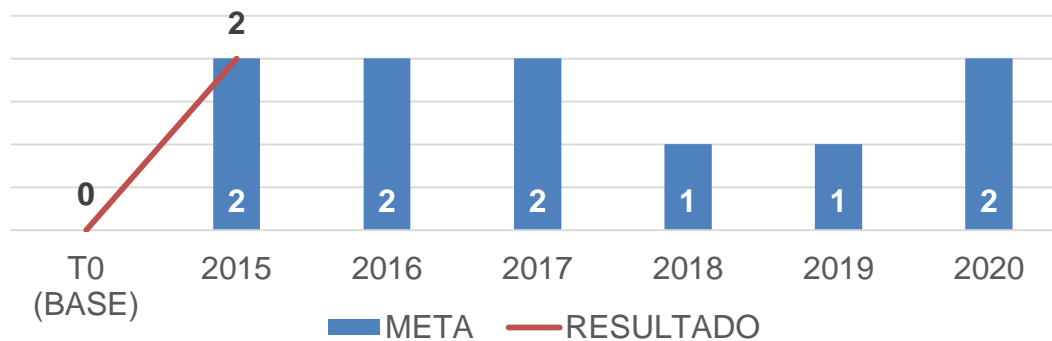

AVALIAÇÃO

- Obras para 2016: 1) Impermeabilização Cobertura TJ;
2) Reforço na Fundação de Baixo Guandú.

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR

Quantidade de reformas e manutenção de pequeno porte

Descrição

Número de reformas de pequeno porte (até 150 mil reais) e manutenções prediais executadas

Responsável

Wagner Oliveira Marques

Objetivo

Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 22/06/2016

MEDIÇÃO 1

META -


STATUS



PRÓXIMA 30/09/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	15	8
2016	20	5
2017	15	-
2018	15	-
2019	15	-
2020	15	-

INDICADOR – Reformas e manutenção de pequeno porte

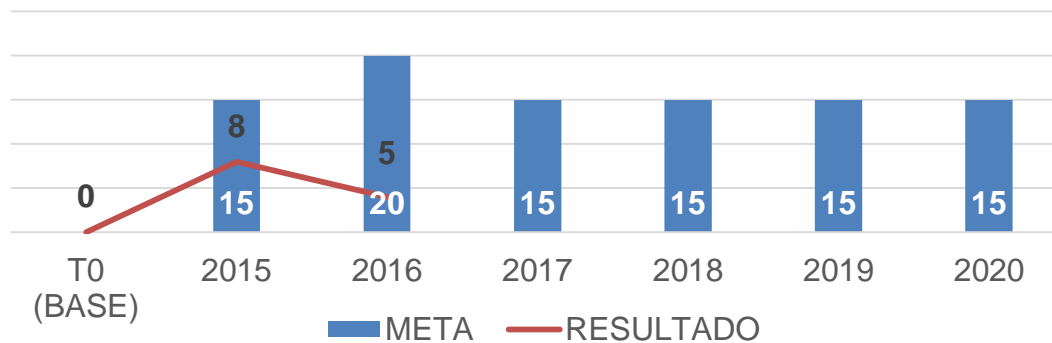

AValiação

- Obras e manutenções para 2016: 1) Reforma fachada Fórum Cível; 2) Cisterna Viana; 3)

Ações Propostas

INDICADOR

Quantidade de reformas e manutenção de pequeno porte

Item	Descrição da Obra	Status
01	Reforma da fachada - Fórum Cível Vitória	Revisão TR
02	Execução de Cisterna do Fórum de Viana	Licitando
03	Instalação de gradil no Fórum de Ibirapu	Concluído
04	Execução de subestação - Fórum Marataízes	Emitir OS
05	Criação da Central Multidisciplinar - Fórum Nova Venécia	Concluído
06	Manutenção cobertura - Fórum Cível Vitória	Andamento
07	Manutenção no Fórum de Nova Venécia	Concluído
08	Manutenção no Fórum de Marataízes	Concluído
09	Manutenção cobertura - Fórum Itarana	Concluído
OBRAS / MANUTENÇÕES CONCLUÍDAS		5
