



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação



Reunião do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

16 de Janeiro de 2015



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

Pauta



- 
- 1. Acompanhamento das Ações da Reunião Anterior**
 - 2. Calendário de Reuniões 2015**
 - 3. Deliberação dos DOD's Encaminhados ao CGTI**
 - 4. Acompanhamento e Controle Orçamentário**
 - 5. Acompanhamento dos Projetos**
 - 6. Indicadores de 2014 do CNJ**
 - 7. Ato para Criação do Comitê Executivo**
 - 8. Demandas para Desenvolvimento da Corregedoria**
 - 9. Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES**



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

The background of the slide features a dark blue grid pattern. In the center, there is a glowing globe. Surrounding the globe are several translucent, rectangular data blocks and lines, suggesting a digital or network environment.

1. Acompanhamento das Ações da Reunião Anterior

Gerenciamento de Ações



Descrição	Responsável	Data Limite	Status
Apresentar justificativa formal para os projetos em atraso.	Marcos Marinho	12/12/2014	Respostas recebidas.

Justificativa Para Atraso nas Contratações



- **Aquisição de Treinamento Oracle:** Licitação fracassada na 1º tentativa pois valores estavam acima das propostas enviadas na fase de cotação. Foram feitas alterações e neste período os cursos ofertados pela empresa ORACLE foram atualizados, sendo assim, o processo foi arquivado e novo Termo de Referência esta sendo elaborado.
- **Serviços de Suporte Técnico Natural Adabas Software AG:** Processo iniciado em 2013, porém foram sugeridas diversas adequações pelo Controle Interno, após adequações foram recebidas cotações com o valor 5 vezes maior que o valor inicial, alegando que o PJES possuía ambiente de alta disponibilidade. Encaminhado e-mail para a empresa fornecedora no mês outubro/2014 com questionamentos e até o presente momento não obtivemos resposta.
- **Aquisição de Licenças AutoCad:** Durante o desenvolver das atividades houveram diversos contratempos, dificuldade em levantar orçamento, análises e readequações dos documentos, além de férias dos servidores da equipe planejamento da contratação e eventos paralelos (multirão, montagem de novos gabinetes e etc) da seção responsável.



Justificativa Para Atraso nas Contratações

- **Aquisição de Projetores:** Durante o desenvolver das atividades houveram diversos contratempos, dificuldade em levantar orçamento, análises e readequações dos documentos, além de férias dos servidores da equipe planejamento da contratação e eventos paralelos (multirão, montagem de novos gabinetes e etc) da seção responsável.
- **Aquisição de Ferramentas da Manutenção:** Processo iniciado em janeiro/2015, documentação finalizada em julho/2014, porém o processo passou por diversas revisões do Integrante Administrativo, atualmente esta seguindo o tramite normal da contratação.
- **Aquisição de Impressora do Diário:** Processo iniciado no mês de fevereiro/2014, encaminhado ao Integrante Demandante para elaboração da documentação, processo retornou a STI apenas em outubro/2014, na fase de cotação recebemos questionamentos e sugestões dos fornecedores, algumas adequações foram necessárias, atualmente o processo esta na fase de cotação.

Justificativa Para Atraso nas Contratações



- **Aquisição de Licenças de Software para Telefonia e Voz IP:** Processo iniciado no mês de maio/2014, no mês de agosto/2014 todos os documentos estavam prontos, aguardando apenas a definição do quantitativo a ser contratado. Em outubro/2014 foi encaminhado para cotação de preços e devido a dificuldades do fornecedor em conseguir comprovação de valores praticados no mercado, atualmente o processo está na STI para avaliação.
- **Aquisição de Licenças Novell:** Tendo em vista a grande complexidade do projeto e falta de regras que necessitam ser definidas pela Administração, o processo ainda esta em fase de planejamento.
- **Aquisição de Interface Celular Para o TJES:** O PJES possui apenas um técnico em Telecomunicações para atendimento de todas as demandas, com isso não está sendo possível se manter atualizado quanto as novas tecnologias da central telefônica, demandando um longo período para estudo da solução.

Justificativa Para Atraso nas Contratações



- **Aquisição de Link de Dados:** O projeto de interligação de todas as unidades jurisdicionais do PJES é complexo e crítico. Alguns serviços da seção estavam conflitando com a elaboração do projeto. Sendo assim o contrato atual foi renovado por mais 12 meses gerando assim maior prazo para estudo e elaboração da documentação.
- **Aquisição de Telefonia Móvel:** Para o desenvolvimento de um novo projeto de contratação era oportuno que Administração se manifestasse quanto a demanda de aparelhos e quais usuários teriam direito a estes aparelhos, porém ate o momento não recebemos as informações solicitadas.
- **Aquisição de Certificados Digitais A3:** Processo iniciado no mês de março/2014, porém devido aos tramites internos do Tribunal, férias de servidores da equipe de contratação, adequação orçamentária, acumulo de trabalho, não foi possível a contratação no ano de 2014.

Justificativa Para Atraso nas Contratações



- **Aquisição de Treinamento em Segurança da Informação:** Processo iniciado no mês de março/2014, porém devido aos tramites internos do Tribunal, férias de servidores da equipe de contratação, adequação orçamentária, acúmulo de trabalho, não foi possível a contratação no ano de 2014.



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

2. Calendário de Reuniões 2015

Calendário de Reuniões 2015



JANEIRO						
S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

FEVEREIRO						
S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

MARÇO						
S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ABRIL						
S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAIO						
S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNHO						
S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

JULHO						
S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AGOSTO						
S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SETEMBRO						
S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OUTUBRO						
S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVEMBRO						
S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DEZEMBRO						
S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Reuniões do Comitê
 Feriados e Pontos Facultativos



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

3. Deliberação dos DOD´s Encaminhados ao CGTI

Processo 2014.00.983.526



Descrição	Objetivo
Contratação para fornecimento de serviços de emissão de Certificados Digitais do tipo A1.	Esta contratação visa garantir ao público em geral, que os sites e suas aplicações acessadas pertencem realmente ao Poder Judiciário do Espírito Santo, bem como a continuidade na prestação de serviços jurisdicionais.

Unidade
Requisitante
**Coordenadoria de
Suporte e
Manutenção**

Coordenação de
Suporte e
Manutenção
Marcos Marinho

Seção de
Segurança
**Rodrigo Esteves
Gomes**

Data da
Autuação na STI
19/08/2014

Item	Descrição
Prazo Estimado	90 dias
Previsão Orçamentária	Há previsão orçamentária para contratação, seu valor estimado para aquisição é de: R\$ 7.452,00 Subelemento: 3.3.90.39.35, 4.4.90.39.93



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo


STI - Secretaria de Tecnologia da Informação



4. Acompanhamento e Controle Orçamentário




Secretaria - Movimentação Orçamentária Registrada

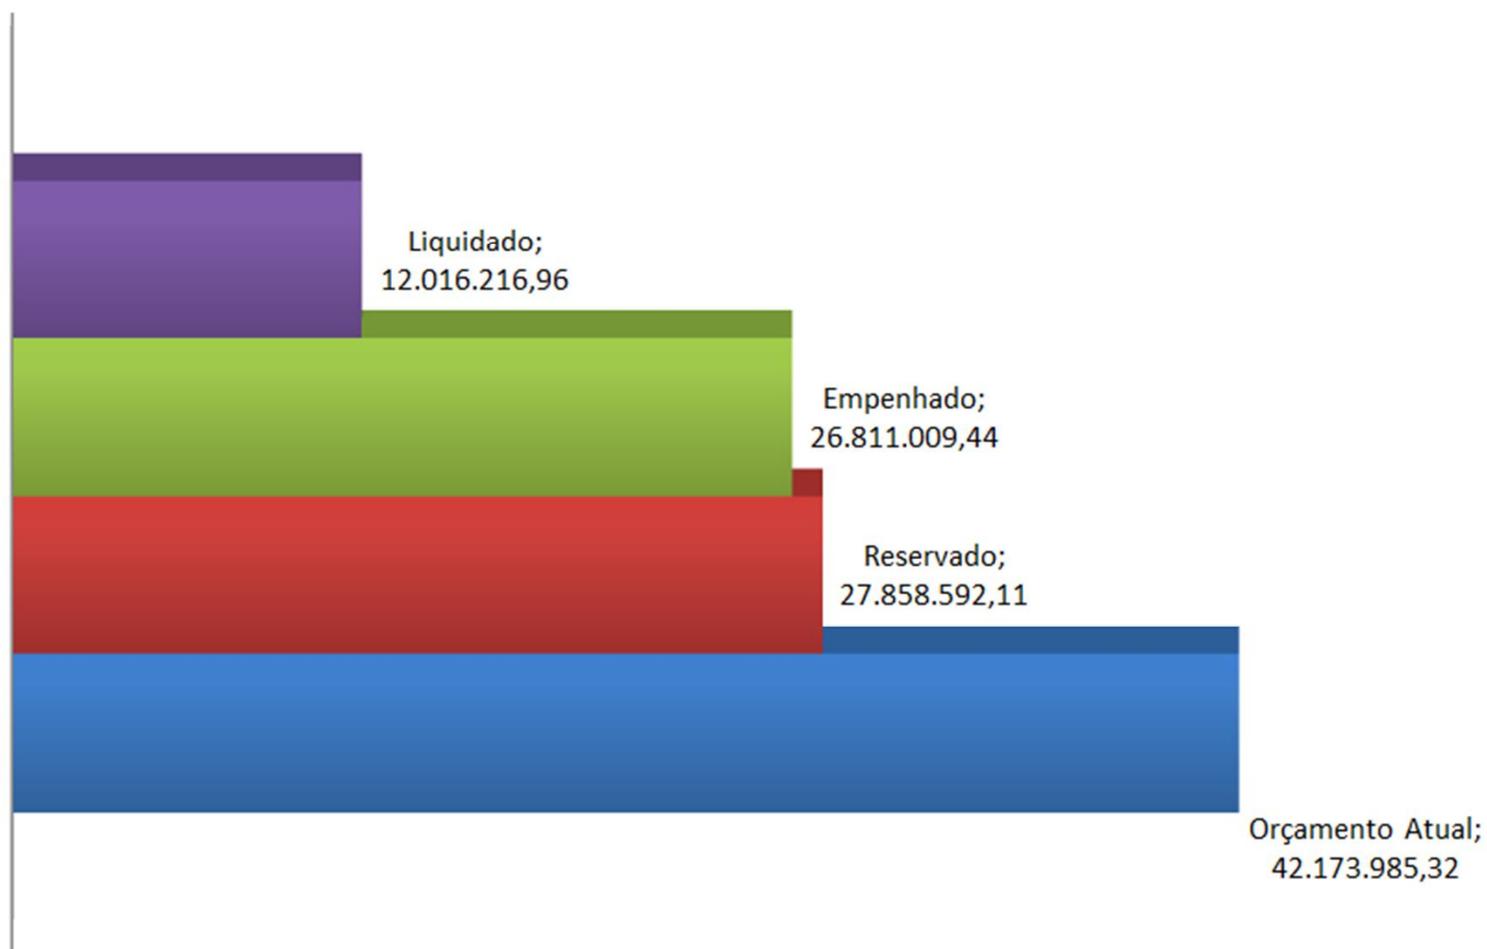



Coordenação - Execução Orçamentária

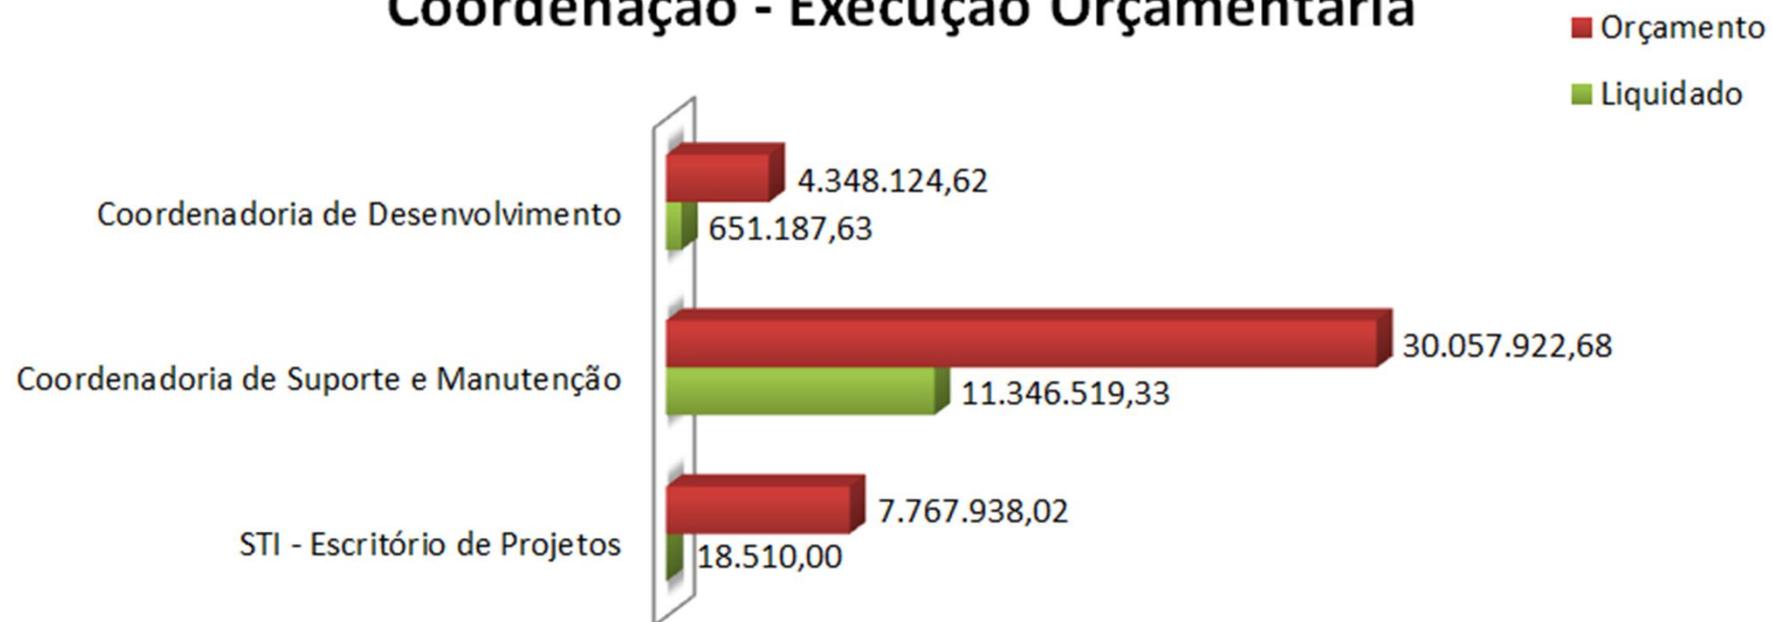



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação



5. Acompanhamento dos Projetos

Projeto de Aquisição de Desktops N° 2013.00.288.231



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 08/04/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 15/04/2014
Termo de Referência elaborado	● 09/05/2014
Edital Publicado	● 18/07/2014
Contrato Assinado	● 10/11/2014
Equipamentos Entregues	● 15/12/2014

Entregas		2014
Desktop	PREV.	1.250 un
	REALIZ.	-

Situação atual

Previsão de entrega dos equipamentos para o dia 05 de fevereiro, o pagamento será realizado com restos a pagar de 2014.

GERENTE DO PROJETO

Daniel Correia

INÍCIO

07/04/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

02/10/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

3.325.000,00

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Governança de TI - N°2014.00.593.379



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 14/05/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 07/07/2014
Contrato Assinado	● 20/11/2014

Entregas		2014
Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços - Governança	PREV.	1
	REALIZ.	-

Situação atual

Contrato assinado dia 20 de novembro, o pagamento será realizado com restos a pagar de 2014.

GERENTE DO PROJETO

Jaderson Falcão

INÍCIO

12/05/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

20/11/2014

TOTAL (R\$)

1.332.425,00

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Aquisição de Licenças Novell

Nº 2014.00.931.252



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 07/08/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 01/07/2014
Termo de Referência elaborado	● 01/08/2014
Empenho Emitido	● 02/10/2014
Contrato Assinado	● 05/12/2014

Entregas		2014
Licenças Adquiridas para Regularização do Ambiente NOVELL (correio eletrônico)	PREV.	3.000
	REALIZ.	-

Situação atual

Tendo em vista a complexidade do projeto a demanda está prevista para contratação em 2015.

GERENTE DO PROJETO

Arthur Aguiar

INÍCIO

30/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

05/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

R\$ 210.990,00

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Aquisição de Nobreak N°2014.00.529.908



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 17/06/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 24/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 28/07/2014
Processo Protocolado	● 24/07/2014
Adesão ARP autorizada	● 26/09/2014
Contrato Assinado	● 01/12/2014
Emissão de Ordem de Serviço	● 11/12/2014

Entregas		2014
Nobreaks	PREV.	900
	REALIZ.	-

Situação atual

Equipamentos entregues no dia 12 de janeiro de 2014. Pagamento será efetuado com restos a pagar de 2014.

GERENTE DO PROJETO

Vinicius Moraes

INÍCIO

30/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

12/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

300.600,00

EXECUTADO (R\$)

-

Projeto de Aquisição de Licenças de Software Telefonia e voz IP - N°2014.00.684.569



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 07/08/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 15/07/2014
Termo de Referência elaborado	● 01/08/2014
Empenho Emitido	● 07/11/2014
Contrato Assinado	● 05/12/2014
Emissão de Ordem de Serviço	● 12/12/2014

Entregas		2014
Aparelhos IP e Licenças	PREV.	44
	REALIZ.	-

Situação atual

Após longo período na Seção de Compras o fornecedor informou que não consegue comprovações dos preços comercializados no mercado, por este motivo estamos providenciando uma nova cotação para validar a proposta enviada.

GERENTE DO PROJETO

Vinicius Moraes

INÍCIO

30/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

12/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

150.000,00

TOTAL FINAL (R\$)

254.815,00

Aquisição de Licenças AUTOCAD

n° 2014.00.555.286



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 09/06/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 25/07/2014
Edital Publicado	● 03/10/2014
Contrato Assinado	● 08/12/2014

Entregas	2014	
Licenças	PREV.	17
	REALIZ.	-

Situação atual

Processo aguardando a liberação do orçamento para efetuação do empenho. Previsão de liberação dia 23 de janeiro de 2015

GERENTE DO PROJETO

Paulo Santos

INÍCIO

23/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO

08/12/2014

TOTAL PREVISTO (R\$)

160.000,00

TOTAL FINAL (R\$)

755.045,00



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

The background of the slide features a stylized globe in the center, surrounded by various digital icons such as folders, documents, and data blocks, all set against a grid pattern.

6. Indicadores de 2014 do CNJ

Indicadores de 2014 do CNJ



		Peso: 20%	Peso: 20%	Peso: 20%	Peso: 20%	Peso: 20%		
		PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO EM TECNOLOGIA	PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO NA FORÇA DE TRABALHO TOTAL MÍNIMA DE TIC	PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO EM AUTOMAÇÃO	PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO EM GOVERNANÇA DE TI	PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO EM CAPACITAÇÃO	Classificação	Global
1	TJPE	16,92%	20,00%	18,71%	20,00%	17,92%	Aprimorado	93,55%
2	TJMT	16,28%	13,33%	18,71%	20,00%	20,00%	Aprimorado	88,33%
3	TJRJ	18,33%	13,33%	20,00%	20,00%	15,42%	Aprimorado	87,08%
4	TJSC	18,33%	20,00%	17,42%	18,20%	12,71%	Aprimorado	86,66%
5	TJDFT	14,62%	20,00%	18,71%	18,92%	14,17%	Aprimorado	86,41%
6	TJRS	17,56%	13,33%	18,71%	20,00%	16,67%	Aprimorado	86,27%
7	TJPA	17,05%	13,33%	16,56%	20,00%	18,75%	Aprimorado	85,69%
8	TJBA	15,77%	13,33%	16,56%	20,00%	18,96%	Aprimorado	84,62%
9	TJPR	18,08%	20,00%	14,41%	16,40%	13,33%	Aprimorado	82,22%
10	TJSE	15,13%	13,33%	17,42%	18,20%	15,42%	Satisfatório	79,50%
11	TJMS	15,13%	13,33%	18,71%	14,59%	16,67%	Satisfatório	78,43%
12	TJRN	16,92%	6,67%	18,71%	18,20%	17,50%	Satisfatório	78,00%
13	TJRR	17,56%	13,33%	14,41%	16,40%	15,42%	Satisfatório	77,12%
14	TJPB	15,13%	6,67%	18,71%	18,20%	18,33%	Satisfatório	77,04%
15	TJCE	16,15%	6,67%	15,27%	18,20%	17,71%	Satisfatório	74,00%

Indicadores de 2014 do CNJ



		Peso: 20%	Peso: 20%	Peso: 20%	Peso: 20%	Peso: 20%		
		PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO EM TECNOLOGIA	PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO NA FORÇA DE TRABALHO TOTAL MÍNIMA DE TIC	PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO EM AUTOMAÇÃO	PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO EM GOVERNANÇA DE TI	PORTE DOS TRIBUNAIS BASEADO EM CAPACITAÇÃO	Classificação	Global
16	TJGO	14,87%	6,67%	18,71%	20,00%	12,50%	Statisfatório	72,75%
17	TJMG	17,56%	6,67%	18,71%	13,51%	14,79%	Statisfatório	71,25%
18	TJSP	16,67%	6,67%	18,71%	14,59%	12,71%	Médio	69,35%
19	TJAC	17,31%	6,67%	17,42%	16,40%	11,04%	Médio	68,83%
20	TJMA	17,56%	6,67%	17,42%	13,51%	12,29%	Médio	67,46%
21	TJAL	17,31%	6,67%	15,27%	16,40%	11,25%	Médio	66,89%
22	TJAP	14,23%	6,67%	17,42%	13,87%	13,33%	Médio	65,52%
23	TJAM	13,59%	6,67%	15,27%	15,32%	13,33%	Médio	64,17%
24	TJTO	15,38%	6,67%	17,42%	12,79%	10,00%	Médio	62,26%
25	TJRO	16,92%	6,67%	17,42%	10,99%	9,79%	Médio	61,79%
26	TJPI	16,15%	6,67%	13,12%	11,71%	11,67%	Médio	59,32%
27	TJES	18,72%	6,67%	8,82%	14,59%	10,42%	Médio	59,21%



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação



7. Ato de Criação do Comitê Executivo

Comitê Executivo



ATO Nº XX/2014

Constitui o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação para fins de auxiliar o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação na análise de demandas de TIC e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o Ato Normativo nº 184/2014, que dispõe sobre a regulamentação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, em cumprimento à Resolução CNJ nº 90;

CONSIDERANDO a necessidade de triagem das demandas propostas em projetos de tecnologia da informação;

RESOLVE:

Art 1º Constituir o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – CETI/TJES para fins proceder à análise prévia das propostas de investimento e alocação de recursos em projetos de TI.

Parágrafo único. Após análise das propostas, cumpre ao Comitê Executivo encaminhar relatório de viabilidade de investimento ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI para deliberação.

Art 2º Designar os membros do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação – CETI/TJES, que será composto:

- I – Jean Carlos de Oliveira – Secretário de Tecnologia da Informação
- II – Marcos Marinho – Coordenador de Suporte e Manutenção/TI
- III – Almir Costa Louro – Coordenador de Desenvolvimento/TI

Art 3º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Vitória/ES, em 12 de janeiro de 2014.

Desembargador SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação



8. Demandas para Desenvolvimento da Corregedoria



1. Simulação Eletrônica de Cálculo de Emolumentos Cartorários

Objetivo: disponibilizar no Portal do TJES e(ou) da CGJES ferramenta eletrônica que possibilite a todos os usuários (magistrados, servidores e, sobretudo os tomadores do serviço notarial e de registro), simularem o cálculo dos emolumentos cartorários e demais tributos devidos pelos atos notariais e de registro praticados pelos delegatários do foro extrajudicial, a exemplo do que já ocorre com as custas judiciais e com a atualização dos créditos nas demandas executivas.

2. Recadastramento Anual Eletrônico dos Delegatários Titulares, Interninos, Interventores e Substitutos do Foro Extrajudicial

Objetivo: disponibilizar ferramenta eletrônica que possibilite à CGJES realizar o recadastramento anual dos delegatários titulares, interinos, interventores e substitutos do foro extrajudicial por meio eletrônico.



Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

STI

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
